

Technická univerzita v Liberci
Fakulta: REK – referát pro rozvoj a výstavbu

Poskytovatel: MŠMT

Institucionální rozvojový plán na rok 2014

Formulář pro závěrečnou zprávu

Cíl: 2.1.5 Mezinárodní prostředí

Dílčí část:

**Vytvoření denního klubu pro zahraniční a české studenty
v rekonstruovaných prostorách budovy E2 – II. etapa**


Interní číslo projektu: 12050

Období řešení cíle	Od: 1. 1. 2014		Do: 31. 12. 2014
Dotace (v tis. Kč)	Celkem:	V tom běžné finanční prostředky:	V tom kapitálové finanční prostředky:
Požadavek	3 500	1 500	2 000
Čerpáno	3 500	1 500	2 000

Odpovědný pracovník: prof. Ing. Ondřej Novák, CSc.

Dílčí řešitel: prof. Ing. Ondřej Novák, CSc.

Další pracovníci: Zdislava Manligová, Jan Rous, Ing. Petr Šmakal, Mgr. Jitka Vencáková, Petr Adamec

	jméno	podpis	datum
Dílčí řešitel:	prof. Ing. Ondřej Novák, CSc.		14 -01- 2015
Odpovědný pracovník:	prof. Ing. Ondřej Novák, CSc.		

ZPRÁVA O PRŮBĚHU ŘEŠENÍ

Cíl projektu			
	Vytvořit podmínky pro skutečné mezinárodní studentské prostředí. Zlepšit kvalitu pobytu zahraničních studentů a umožnit užší spolupráci studentů českých i zahraničních vysokých škol.		
Plnění stanovených ukazatelů do (jaké míry byly splněny, případně důvod, proč splněny nebyly)	Stanovené ukazatele projektu		
	Ukazatel	plnění	
	Rekonstruovaná plocha budovy E2 Nové prostory pro mezinárodní setkávání studentů včetně: - infoslужeb v cizích jazycích, - knihovnických služeb, - čítárny, - vybavení výpočetní technikou pro účely informačních služeb pro zahraniční studenty a přístupu k EIZ, - vybavení projekční technikou s možností videokonferencí.	Splněno na 100 % Splněno na 100%	

Plnění stanovených kontrolovatelných výstupů	Stanovený kontrolovatelný výstup		plnění
	- zrekonstruované prostory budovy E2 - denní klub pro zahraniční a české studenty - nové prostory pro trávení volného času studentů v prostorách kampusu TUL - vybavení zrekonstruovaných prostor výpočetní technikou s přístupem k EIZ - nové centrum informačních služeb pro zahraniční studenty - možnost mezinárodního kontaktu studentů s využitím videokonferencí - základní knihovni služby přímo v kampusu TUL, vč. čítárny		Splněno na 100 %
			Splněno na 100 %
			Splněno na 100 %
			Splněno na 100 %
Změny v řešení	Pokud došlo v průběhu řešení ke změnám, uveďte je, vysvětlete příčinu, schváleno dne		
	č.	Jednotlivé změny (přidejte řádky podle potřeby)	Zdůvodnění
	1	----	----
	2	----	----
Postup řešení:			
Přípravná fáze projektu proběhla v r. 2012: zpracování studie, zadání zpracování projektu pro stavební povolení a pro realizaci stavby. V rámci I. etapy projektu (v r. 2013) byla vyhlášena podlimitní veřejná zakázka „Vestavba mateřské školy a prostor pro trávení volného času studentů do objektu E2 TUL včetně opravy střešního pláště“. 13. 11. 2013 byla podepsaná Smlouva o dílo s firmou HAVAX a.s.. Stavba byla zahájena v listopadu 2013. V r. 2013 bylo také nakoupeno vybavení pro studenty, které je umístěno v budovách TUL, na místech sloužících studentům. Ve II. etapě (v r. 2014) byla stavebně dokončena vestavba studentského klubu. Pro vybavení interiéru klubu nábytkem a výpočetní technikou byly vyhlášeny veřejné zakázky malého rozsahu. Zadávací dokumentaci pro VŘ vybavení interiéru zpracovala Ing. Vojtíšková ze Statické a projekční kanceláře REPOS.Lbc, s.r.o., nábytek dodala vítězná firma ABCD Služby školám s.r.o., výpočetní techniku firma C SYSTÉM CZ a.s.. Dne 9.12.2014 byl klub slavnostně předán do užívání studentům. Přístupová chodba ke klubu byla z důvodu další plánované přestavby budovy E2 upravena pouze částečně – bylo vyměněno a doplněno osvětlení a srovnány všechny kabely a potrubí pod stropem chodby.			

Specifikace čerpání finanční dotace na řešení projektu			
		Přidělená dotace na řešení projektu (v Kč)	Čerpání dotace (v Kč)
1.	Kapitálové finanční prostředky celkem	2 000 000	2 000 000
1.1	Dlouhodobý nehmotný majetek (SW, licence)	0	0
1.2	Samostatné věci movité (stroje, zařízení)	0	0
1.3	Stavební úpravy	2 000 000	2 000 000
2.	Běžné finanční prostředky celkem	1 500 000	1 500 000
Z toho	Osobní náklady:		
2.1	Mzdy (včetně pohyblivých složek)	0	0
2.2	Odměny dle dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr	0	0
2.3	Odvody pojistného na veřejné zdravotní pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a příděly do sociálního fondu	0	0
	CELKEM osobní náklady	0	0
	Ostatní:		
2.4	Materiální náklady	500 000	886 346,81
2.5	Služby	1 000 000	613 653,19
2.5	Ostatní náklady (inzerce na ISVZ)	0	0
2.6	Cestovní náhrady	0	0
2.7	Stipendia	0	0
3.	Celkem běžné a kapitálové finanční prostředky	3 500 000	3 500 000

Bližší zdůvodnění čerpání v jednotlivých položkách		
Číslo položky (viz předchozí tab.)	Název výdaje a jeho zdůvodnění	Částka (v tis. Kč)
1.3	Stavební práce (investiční)	2 000
2.4.1	Nábytek	757
2.4.2	Počítače	123
2.4.3	Zabezpečení PC	7
2.5.1	Stavební práce (neinvestiční)	520
2.5.2	Výměna světlíků	10
2.5.3	Zpracování zadávací dokumentace na vybavení interiéru nábytkem	22
2.5.4	Výzdoba klubu - tisk plakátů a fotografií	2
2.5.5	Úprava chodby – srovnání slaboproudých kabeláží a oprava osvětlení v chodbě před studentským klubem	59

Fotodokumentace – **kontrolovatelné výstupy:**

- zrekonstruované prostory budovy E2




původní stav (bývalé dílny)



stav po rekonstrukci

- denní klub pro zahraniční a české studenty



vstup v budově E2 přístup do budovy E2 a ke klubu ze strany MŠ

- nové prostory pro trávení volného času studentů v prostorách kampusu TUL



prostory klubu – přízemí




prostory klubu – 1. patro

- vybavení zrekonstruovaných prostor výpočetní technikou s přístupem k EIZ



- nové centrum informačních služeb pro zahraniční studenty



- možnost mezinárodního kontaktu studentů s využitím videokonferencí




zasedací místnost klubu



mobilní videokonferenční set

- základní knihovní služby přímo v kampusu TUL, vč. čítárny





Vytvoření denního klubu pro zahraniční a české studenty v rekonstruovaných prostorách budovy E2 – II. etapa

projekt 12150

Institucionální plán TUL pro rok 2014

Cíl: 2.2 Mezinárodní prostředí na TUL

Řešitel: prof. Ing. Ondřej Novák, CSc.



Cíle projektu

Vytvořit podmínky pro skutečné mezinárodní studentské prostředí.

Zlepšit kvalitu pobytu zahraničních studentů a umožnit užší spolupráci studentů českých i zahraničních vysokých škol.

Institucionální plán TUL pro rok 2014, str. 76

Řešení projektu

2012 - přípravná fáze projektu:

zpracování studie, zadání zpracování projektu pro
stavební povolení a pro realizaci stavby

2013 - I. etapa realizace:

výběr zhotovitele, zahájení stavby

2014 - II. etapa realizace:

dokončení stavby, vybavení interiéru,
9.12. otevření klubu

Plnění stanovených ukazatelů

1. Rekonstruovaná plocha budovy E2 **splněno**

2. Nové prostory pro mezinárodní setkávání studentů včetně: **splněno**

- infoslужeb v cizích jazycích,
- knihovných služeb,
- čítárny,
- vybavení výpočetní technikou pro účely informačních služeb pro zahraniční studenty a přístupu k EIZ,
- vybavení projekční technikou s možností videokonferencí.

Kontrolovatelné výstupy projektu

- zrekonstruované prostory budovy E2

původní stav
(dříve zde byly dílny)




vestavba klubu

upravená přístupová
chodba ke klubu



Kontrolovatelné výstupy projektu

- denní klub pro zahraniční a české studenty - nové prostory pro trávení volného času studentů v prostorách kampusu TUL

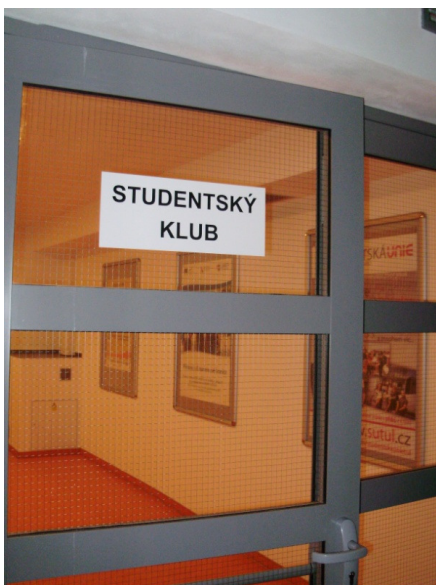

- klub se nachází v budově E2 v kampusu TUL na Studentském náměstí
- otevřen je stejně jako celá budova, tj. od 6.00 do 20.00 hod.



přístup ze strany MŠ

Kontrolovatelné výstupy projektu

- denní studentský klub - přízemí



Klub je zajímavě členěn.
Je zde i místo pro
imobilní studenty.



Kontrolovatelné výstupy projektu


- denní studentský klub – 1. patro



místnost s PC a tiskárnou



koutek
s křesílky
nad
schodištěm

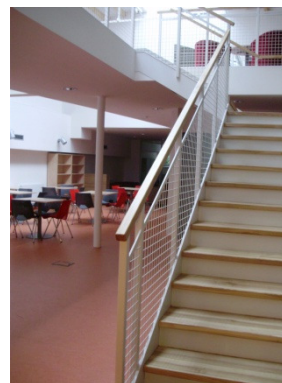

tichá zóna, čítárna

Kontrolovatelné výstupy projektu

- vybavení zrekonstruovaných prostor výpočetní technikou s přístupem k EIZ



v místnosti s PC je k dispozici
také tiskárna s kopírkou



Kontrolovatelné výstupy projektu

- nové centrum informačních služeb pro zahraniční studenty



- informace v anglickém jazyce poskytuje zaměstnanec UKN
- sídlí zde Studentská komora AS TUL
- Studentská unie TUL, ESN a ERASMUS mají v klubu své informační místo
- své služby zde poskytuje UKN

Kontrolovatelné výstupy projektu

- možnost mezinárodního kontaktu studentů s využitím videokonferencí

Mobilní videokonferenční komplet je od r. 2013 k zapůjčení na rektorátě TUL


Pro videokonference studentů lze využít zasedací místnost klubu.



Kontrolovatelné výstupy projektu

- základní knihovní služby přímo v kampusu TUL, vč. čítárny

místo pro knihovníka
v zasedací místnosti
Studentské komory AS TUL

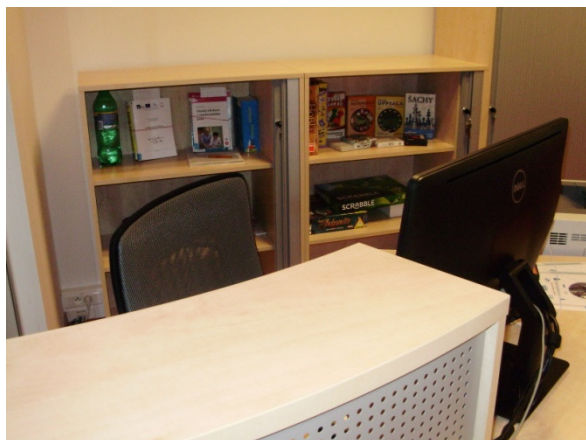

kromě knih lze půjčit i stolní hry

tichá čítárna v 1.p.




Finanční plnění

Přidělená dotace: investice 2 mil. Kč
běžné prostředky 1,5 mil. Kč

Čerpání dotace	Investice (v tis. Kč)	běžné prostředky (v tis. Kč)
Stavební práce investiční	2 000	
Stavební práce neinvestiční		530
Úprava chodby (srovnání slaboproudých kabeláží a oprava osvětlení)		59
Zpracování projektu vybavení interiéru nábytkem		22
Nábytek		757
Počítače		130
Výzdoba klubu (tisk plakátů a fotografií)		2
CELKEM	2 000	1 500

Zajímavosti

Výzdoba - práce studentů
foto-plakáty v hale
fotografie v čítárně
tapiserie v PC místnosti



Výzdoba – spolupráce fakult a ost.
FS, FT, FM, UKN, REK (OIS, ERASMUS)

Informace o studentských organizacích
Studentská komora AS TUL
Studentská unie TUL
ESN (Erasmus student network)

